# SYS FASHION

## Gestione backlog prodotto

otconsulting

# Introduzione

**Cos'è questa guida?**

Uno standard operativo per la gestione strutturata del backlog di prodotto, applicabile a tutti i team di sviluppo e manutenzione software.

**Obiettivi:**

- Trasformare il backlog da "lista di cose da fare" a strumento strategico
- Generare benefici misurabili a medio-lungo termine
- Sviluppare una cultura di miglioramento continuo nel team

**A chi è rivolta:**
Project Manager/Responsabili che vogliono implementare o migliorare la gestione del backlog di prodotto.

©OT Consulting. All rights reserved

# Processo in sintesi

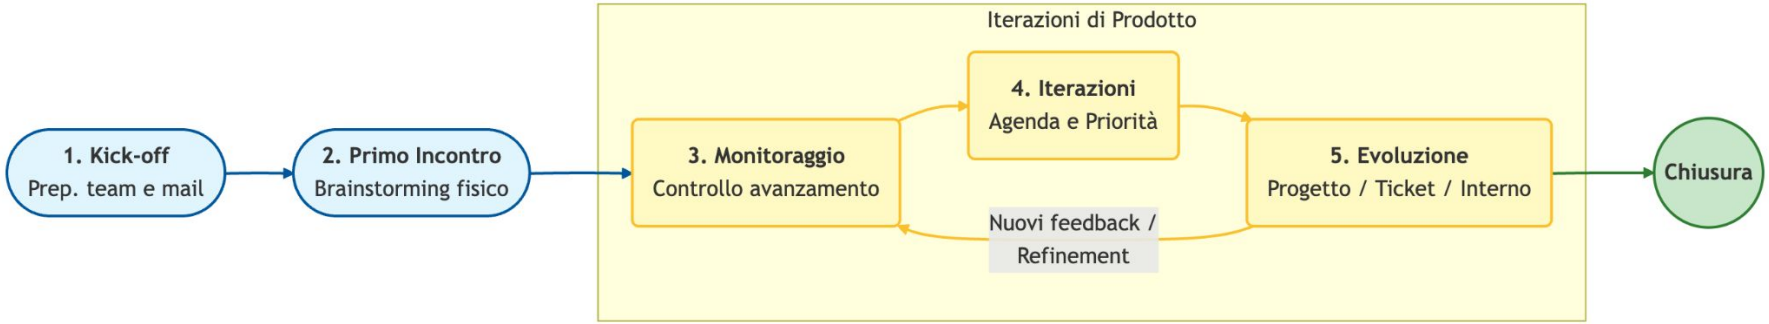


©OT Consulting. All rights reserved

otconsulting

# Kick-off e primo incontro

**Preparazione:**

- Mail di preavviso (1 settimana prima)
- Presenza fisica consigliata
- Template backlog da condividere (opzionale)

**Struttura primo incontro (60-90 min):**

- Setup: carta e penna, no PC
- Introduzione e allineamento (10-15 min)
- Brainstorming individuale (5-10 min)
- Raccolta e discussione collettiva (40-60 min)
- Chiusura e prossimi passi (5-10 min)

©OT Consulting. All rights reserved

# Monitoraggio e controllo

Responsabilità PM:

**Controllo task assegnati:**

- Check settimanali rapidi (15 min via chat/1:1)
- Aggiornamenti diretti nel backlog
- Escalation tempestiva se blocchi/ritardi

**Attività proattive:**

- Approfondimenti su proposte promettenti
- Analisi preliminari costo/beneficio
- Richieste feedback cliente
- Nuove proposte da monitoraggio quotidiano

→ Tutto registrato e condiviso al prossimo incontro

©OT Consulting. All rights reserved

otconsulting

# Iterazioni successive

**Cadenza**: 1 mese (o 3 settimane se backlog ricco o performante)
**Durata**: 1 ora circa

**Agenda standard:**

1. **Revisione progressi** (5-10 min): Stato avanzamento e allineamento backlog
2. **Aggiornamenti team** (10 min): Report su task assegnati
3. **Nuove proposte** (25-30 min): Discussione e prioritizzazione
4. **Prossime azioni** (10 min): Definire task e responsabili

***Post-incontro:*** *Minuta via mail con task e scadenze*

©OT Consulting. All rights reserved

otconsulting

# Campi del file

- **ID:** Identificativo dell'attività inserita
- **Attività:** Descrizione dell'attività inserita nel backlog
- **Vantaggi:** Possibili vantaggi ottenibili
- **Author:** Chi ha inserito la proposta
- **Priorità:** Da P0 più alta, P3 più bassa.
- **Rischio:** Indicazione del grado di rischio
- **Effort :** Indicazione 'sommaria' dell'effort per completare l'attività
- **Area**: Indicazione sintetica, del tipo di vantaggio: Ottimizzazione, sicurezza ecc..
- **Stato:** Stato attuale della proposta:
  - **Non discusso**
  - **Discusso**
  - **Pronto**
  - **In corso**
  - **Bloccato**
  - **Completato**
  - **Obsoleto**
  - **Proposto**
- **Target:** Obiettivo temporale 'ideale'.
- **Evo/Ticket:** Riferimento dell'iniziativa e/o ticket in cui è stata inserita la proposta.
- **Note:** Varie ed eventuali

**Esempio generico**

- **ID:** B05
- **Descrizione:** Job rigenera ordini annullati, con max numero retry
- **Vantaggi:** Ambienti di Test/Staging senza errori perenni
- **Author:** Simone
- **Priorità: P2**
- **Rischio:** Alto
- **Effort :** 1 gg
- **Area**: Ottimizzazione, pulizia errori
- **Stato:** *Discusso*
- **Target:** 03/26
- **Evo/Ticket:** FGOM-1254
- **Note:** Proporre di inserirle nelle DEB al SAL BAC

©OT Consulting. All rights reserved

otconsulting

# Evoluzioni punti backlog

| Tipo | Effort (GG) | Visibilità Cliente | Output |
|---|---|---|---|
| Intervento Interno (6.3) | <2.5 | Non necessaria, solo interna | Inserito in un progetto in corso |
| Ticket (6.2) | 2-5gg | Allineamento preventivo | Ticket dedicato + validazione |
| Proposta Progetto (6.1) | >5gg | Approvazione obbligatoria | Project Charter + offerta |
| Pacchetto Progetti (6.4) | 50+ | Visione medio-termine | Offerta multi-progetto |

©OT Consulting. All rights reserved

otconsulting

# Evoluzione punti backlog - 2

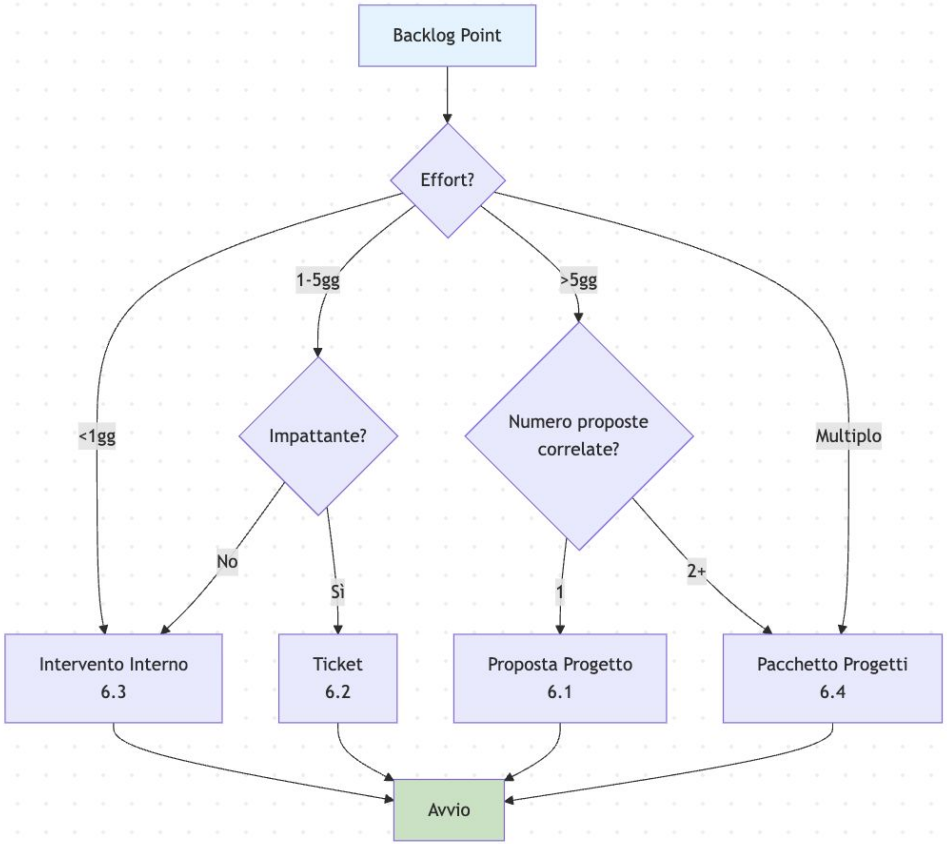


©OT Consulting. All rights reserved

otconsulting

# Fattori critici di successo

**Per il PM:**

- Facilitatore, non decisore unico
- Garantire partecipazione di tutti (coinvolgere i meno attivi)
- Gestire tempo e bilanciare discussioni
- Aggiornamento continuo backlog

**Per il Team:**

- Presenza costante agli incontri
- Ownership diffusa delle proposte
- Contributo attivo (*minimo 1 proposta/ciclo*)

**Per il Processo:**

- Minuta post-incontro sempre
- Monitoraggio settimanale
- Cadenza rispettata (mensile)

©OT Consulting. All rights reserved

# Prossimi passi

**1. Review guida completa**
Documento disponibile con tutti i dettagli operativi: Guida Gestione backlog prodotto - SYS Fashion

**2. Template backlog**
File pronto all'uso con campi standard: Backlog prodotto

**3. Pianificare kick-off**
Fissare primo incontro con il proprio team

**4. Supporto PMO**
Domande, dubbi e affiancamento disponibile

**5. Check a 45-50 GG**

Ci rivedremo ad un incontro PMO, dove discutiamo insieme di come sta andando, feedback generali e/o miglioramenti possibili, criticità ecc...

©OT Consulting. All rights reserved

otconsulting

# Grazie
